

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzionin. 440 del 22 FEB. 2019

Città di Modica

361

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Impresa: "S.L. Infrastrutture s.r.l." - CIG: 6628464D85-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/10/2015 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale, accordo quadro" - CIG. 6628464D85 - per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 780,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad € 2.560,00 per costo manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta ed € 11.000,00 somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.273 del 02/10/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 693 del 14/03/2016;

che a seguito di gara a cottimo fiduciario, esperita in data 07 aprile 2016 giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " S.L. Infrastrutture S.r.l."- Via Toscano n.18 Modica (RG) - P.Iva 01451810889 per l'importo complessivo di € 39.000,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 24,9999% comprensivo di € 780,00 quali oneri di sicurezza ed € 2.560,00 per costo manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 1279 del 11/05/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1623 del 22 giugno 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1623/2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 693/2016 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.604 del bilancio 2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/07/2016 REP. 15905 registrato a Modica il 19/07/2016 al n. 1923 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 15/07/2016 con il tempo utile di giorni 365 o in alternativa prima fino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

che in data 07/04/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 21.293,31 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 04/07/2016;

che in data 08/09/2017 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal dell'importo di €. 12.689,76 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 05/09/2017 ed €.1.643,41 oltre iva 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura ;

preso atto che l'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l"- Via Toscano n.18 Modica (RG) -- P.Iva 01451810889 ha realizzato i lavori di che trattasi;

rilevato che con nota trasmessa il 09/11/2017 brevi manu, l'Impresa comunicava la variazione della compagine societaria da Leone Giuseppe nato a Modica il 06/04/1994 C.F: LNEGPP94D06F258B A Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997 C.F:LNEFNC97B25F258A giusto atto pubblico del 27/09/2017 repertorio 562 registrato a Modica il 28/09/2017 al n.2600/1T stipulato dal Notaio Guglielmo D'Angelo ed allegato alla predetta nota;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/01/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €.34.153,84 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 33.983,07 rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.170,77, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n.13331866 del 04/12/2018 con scadenza di validità al 03/04/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 15/11/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 15/01/2019 e relativo ai "lavori di manutenzione ordinaria e straordinariae di pronto intervento delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale, accordo quadro" CIG. 6628464D85-

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4) Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 208,34 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5) Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €37,57 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1623 del 22 giugno 2016 del Responsabile P.O. del XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.604/2016;

7) Di prendere atto dell'economia complessiva di €5.547,35 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 50.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 44.452,65 ed allegato al presente provvedimento;



8) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 5.547,35 dal capitolo 12010/030 impegno n.604 del bilancio 2016 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10)Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11)Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.C. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

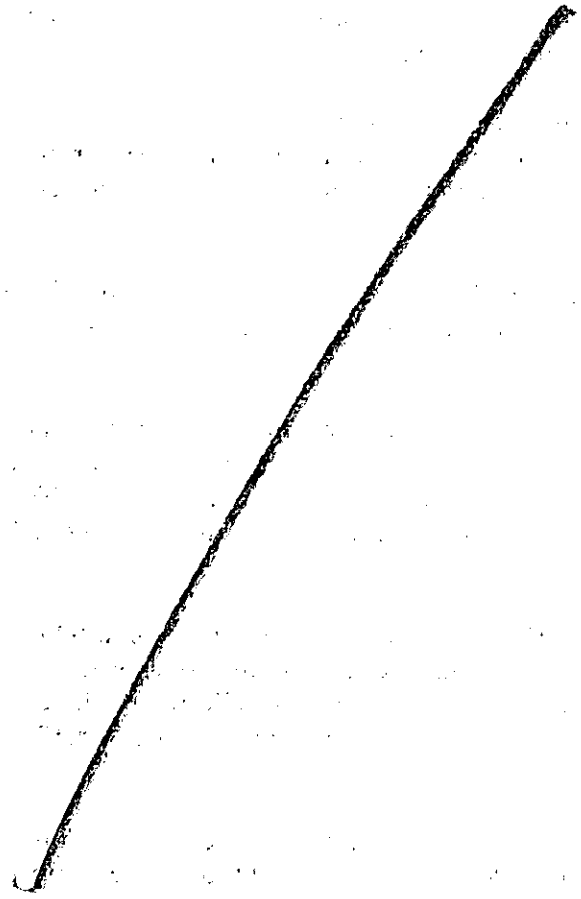



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni

LAVORI : Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento delle opere di corredo di alcune strade del territorio Comunale - CIG: 6628464D85.-

IMPRESA: S.L. Infrastrutture s.r.l. Via Toscano n.18 97015 Modica P.Iva 01451810889

CONTRATTO: n°15905 di rep. del 14/07/2016 registrato a Modica il 19 luglio 2016 al n. 1923 Serie 1T

IMPEGNO Determinazione n.1623 del Responsabile P.O. del XI Settore del 22 giugno 2016 al capitolo 12010/030 impegno 604 del bilancio 2016;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	-----
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	50.000,00
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	33.983,07
Iva al 22%	€.	7.476,28
Sommano	€.	41.459,35

Saldo finale lavori:

	€.	170,77
Iva al 22%	€.	37,57
Sommano	€.	208,34

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	780,00
Per anticipazioni a fattura acquisti	€.	2.004,96

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	44.452,65
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	50.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	44.452,65

Somma residua disponibile	€.	5.547,35
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 15/01/2019
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Busone



Il Responsabile P.O. X Settore
 Geom. Giorgio Scallo

(F)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento delle opere di corredo di alcune strade del territorio Comunale CIG.6628464D85

IMPRESA: S.L. Infrastrutture s.r.l. Via Toscano n.18 97015 Modica (RG)
P. Iva 01451810889.-

CONTRATTO: n° 15905 di rep. del 14 luglio 2016 reg.to a Modica il 19 luglio 2016 al n° 1923 Serie 1T.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Alla visita tenutasi il giorno 15 (quindici) gennaio 2019 sono intervenuti i signori:

Leone Francesco in qualità di Amministratore dell' Impresa, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato: che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;



che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 15/02/2017 ;

che l'importo netto dei lavori eseguiti di €34.153,84 ed è minore di €4.846,16 rispetto i all'importo delle somme complessivamente autorizzate per € 39.000,00;

- che i lavori vennero ultimati in data 05 (cinque) settembre 2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 04/01/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto e nei termini e modalità previste all'art. 4 del contratto d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.13331866 del 04/12/2018 con validità di scadenza il 03/04/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale, eseguiti dall'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica Via Toscano n.18 in base al contratto d'appalto n°15905 di rep. del 14/07/2016 registrato a Modica il 19/07/2016 al n.1923 Serie I T sono stati regolarmente eseguiti e liquidati il credito dell'impresa come segue:



A) Ammontare del conto finale € 34.153,84

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 07-04-2017 di € 21.293,31

Certificato n°2 del 08-09-2017 di € 12.689,76

Sommano € 33.983,07 € 33.983,07

Resta il credito totale dell'impresa € 170,77

Per I.V.A. Al 22% € 37,57

Somma il credito totale dell'impresa € 208,34

(diconsi Euro Duecentotto/34) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 15/01/2018

L'Impresa

S.I. INFRASTRUTTURE s.r.l.

Amministratore Unico

Francesco Deane

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
604/01/2016	18-02-2019	€ 208,34	12010/030

Modica, 18-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 FEB. 2019 al 12 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione
